

Planifikimi i projektit "Online Quiz System"

PUNOI:

**Anxhela Myftaraj, Erta Zogu,
Eva Bardhoku, Sindi Prifti, Suela Hasanaj**

PRANOI:

Prof. Asoc. ENIDA SHEME



Përmbajtja:

- Scope
 - Work Breakdown Structure
 - Time management
 - Cost Management
 - Resource Management
 - Communication Management
 - Quality planning
 - Risk Management
 - Stakeholder management
 - Impact
-

1.Scope

Qëllimi: Të zhvillohet një sistem online kuizesh që jep rezultate të menjëhershme.


Brenda scope: ndërfaqe përdoruesi, pyetje me alternativa, rezultate pas përfundimit.

Jashtë scope: autentikim, përzierje pyetjesh, nivele vështirësie.

2. Work Breakdown Structure + Deliverables




Faza	Detyra	Deliverables
Inicimi	Hartimi i Project Charter	Project Charter
Planifikimi	Dokumenti i planifikimit, WBS, buxheti	Dokumenti I planifikimit
Dizenjimi	Skicat e ndërfaqes, struktura e bazës së të dhënave	Wireframes, ER diagram
Zhvillimi	Frontend + Backend	Aplikacion funksional
Testimi	Testimi i funksionalitetit dhe UX	Raporte testimi
Prezantimi	Prezantimi i produktit	Prezantimi përfundimtar

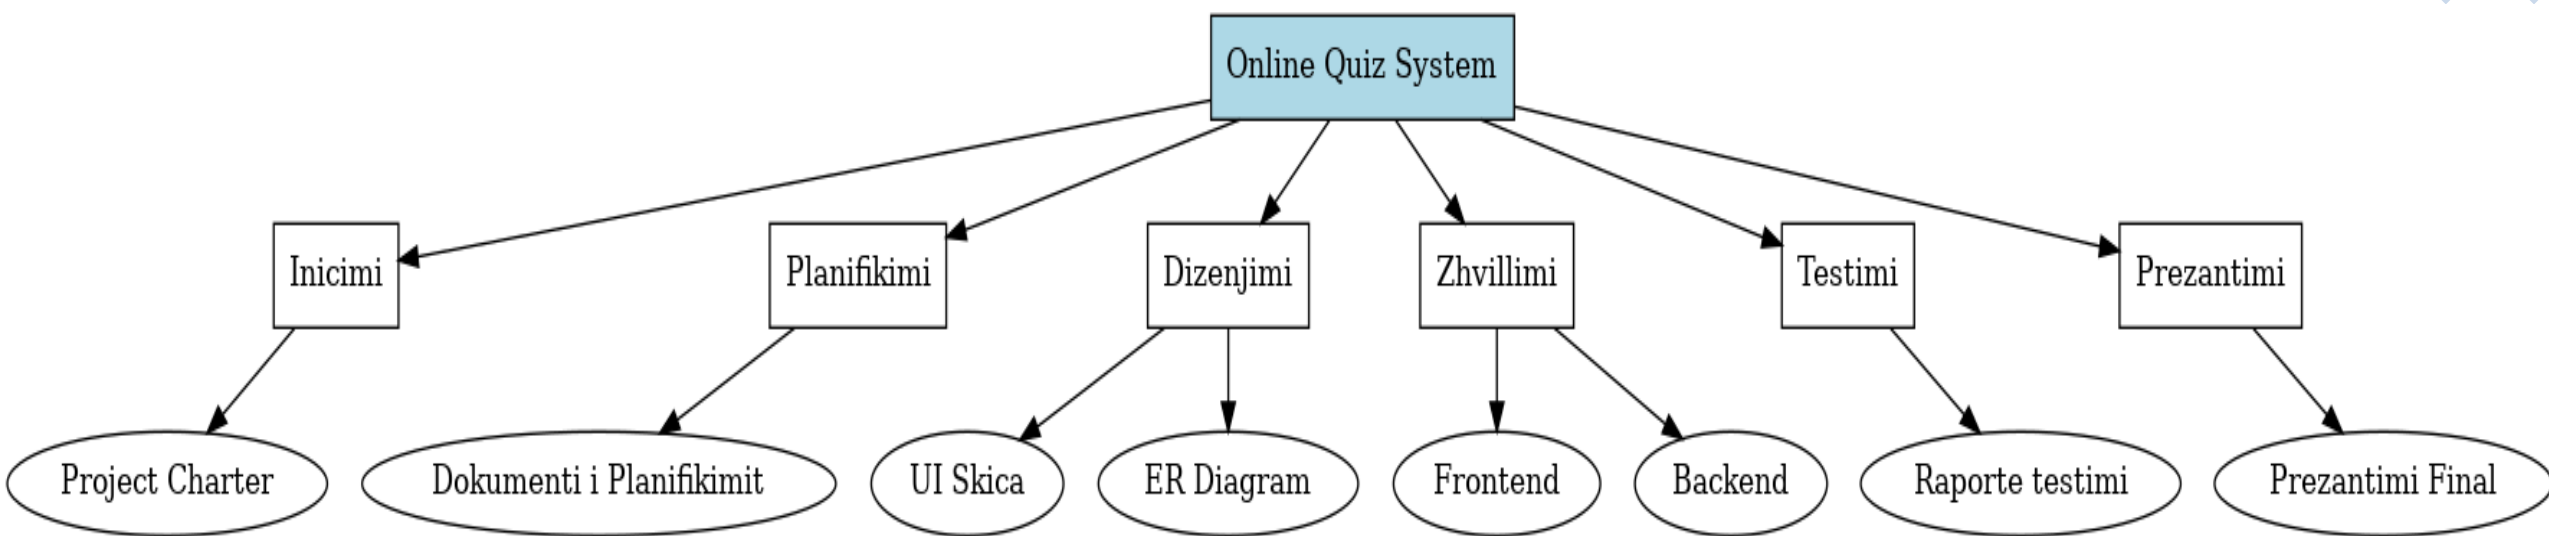

3.Time Management (Gantt + Milestones)

Faza / Ngjarje Kryesore	Fillimi	Përfundimi
Hartimi i Project Charter dhe Planifikimi	7 Prill 2025	17 Prill 2025
Mbledhja e Kërkesave	11 Prill 2025	18 Prill 2025
Dizenjimi i Sistemit (UI/UX + Baza e të Dhënave)	16 Prill 2025	22 Prill 2025
Zhvillimi i Frontend-it	21 Prill 2025	28 Prill 2025
Zhvillimi i Backend-it (API & DB)	25 Prill 2025	5 Maj 2025
Integrimi dhe Testimi i Funksioneve	2 Maj 2025	9 Maj 2025
Dokumentacioni dhe Manuali i Përdoruesit	8 Maj 2025	15 Maj 2025
Implementimi Final dhe Prezantimi	16 Maj 2025	29 Maj 2025

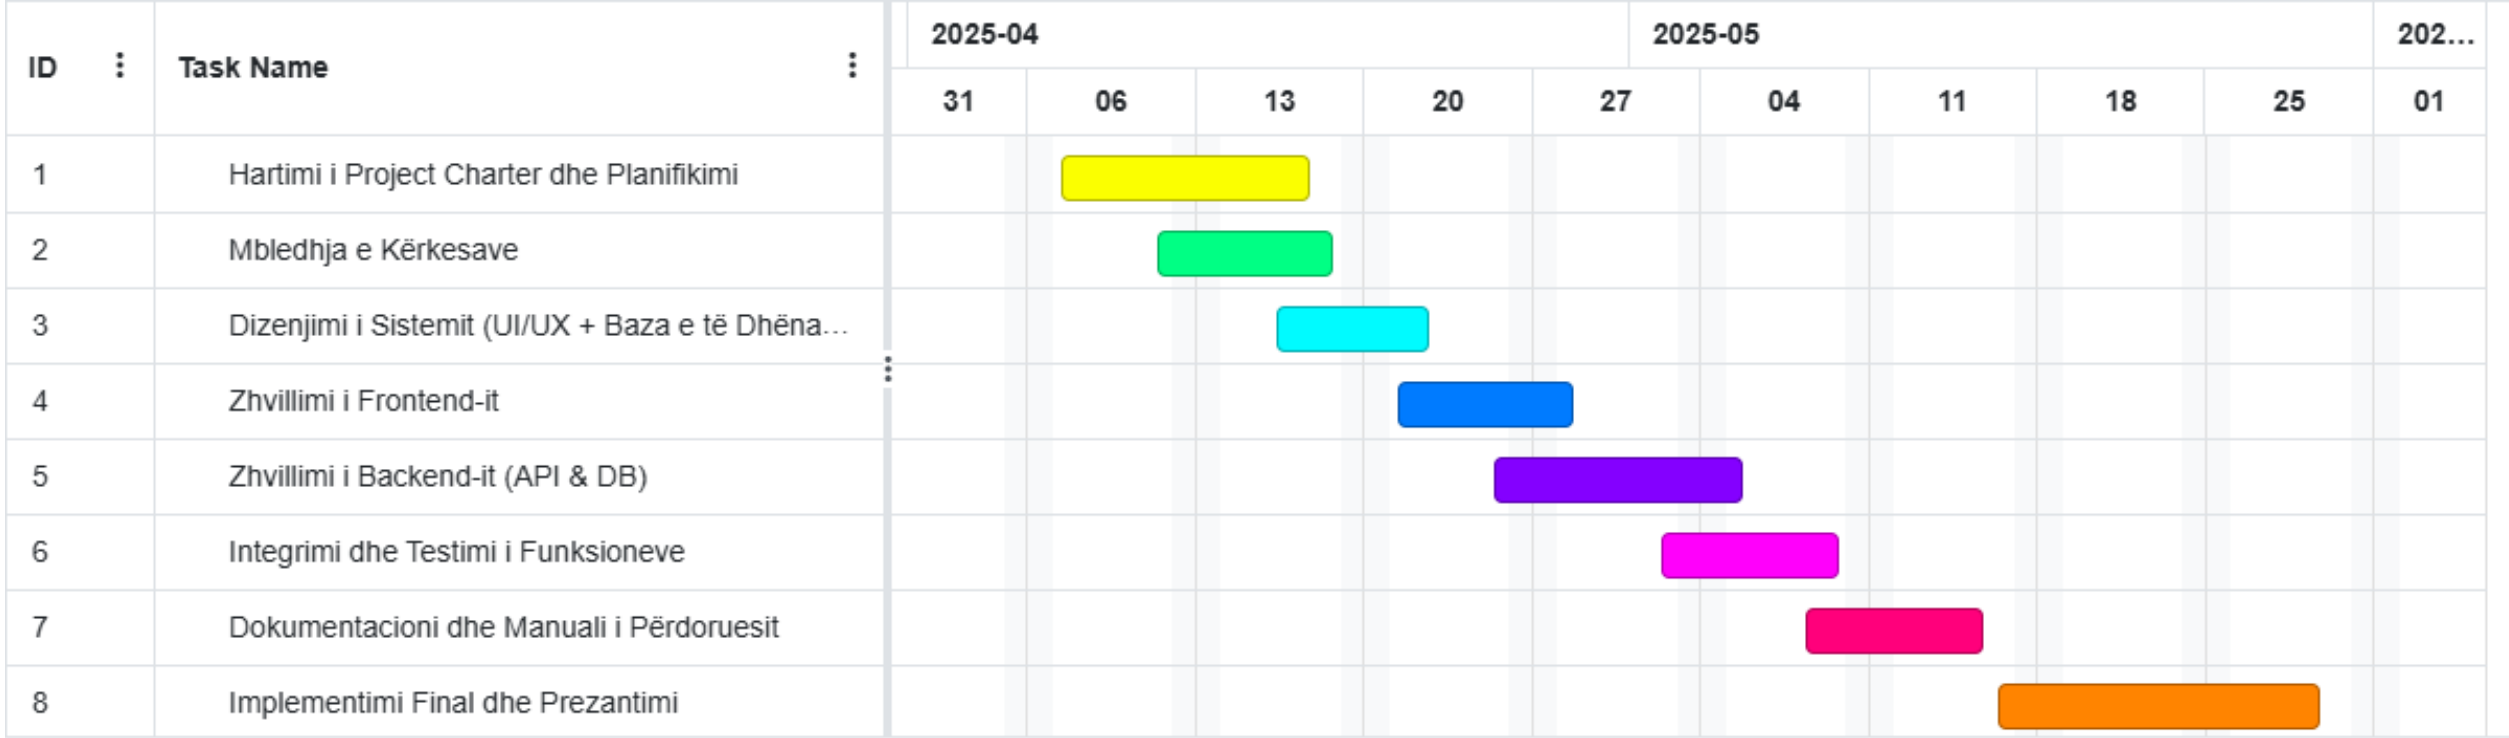

4. Cost Management (Buxheti)

Kategoria	Kosto (€)
Puna e ekipit (5 anëtarë x 10 orë x €5)	€250
Internet, takim, kafe	€30
Domain + Hosting	€20
Totali	€300

5.Resource Management

Burime njerëzore:

- 1 Project Manager
- 2 Developer
- 1 Designer
- 1 Testues

Burime infrastrukturore:

- Laptopë personale
- Shërbim hosting + domain
- Platforma bashkëpunimi (GitHub, Google Meet)

6.Communication Management

Kush	Informacion	Kujt	Formati	Frekuenca
PM	Progresi i projektit	Të gjithë anëtarët	Email + prezantim	1 herë/javë
Të gjithë	Raportim javor	PM	Hard-copy ose elektronik	Çdo javë
Takime	Diskutim për detyrat	Ekipi	Google Meet	Çdo 3 ditë

7. Quality Planning

Standartet: funksionalitet i plotë, pa error gjatë testimit

Kontroll cilësie: testime manuale, feedback nga përdorues testues

Mjetet: tabela testimi, formë vlerësimi

8.Risk Management

Risku	Plan B
Vonesa në përfundimin e kodimit	Riorganizimi i detyrave dhe ndarja e punës paralelisht
Probleme teknike me hostimin	Zëvendësim i shpejtë me një host tjetër rezervë

9.Stakeholder Management

Stakeholder	Lloji	Si informohet	Si motivohet
Studentët	Klientë finalë	Prezantim dhe testim	Akses falas në sistem
Profesorja	Mbështetëse	Raport javor	Raport progresi
Anëtarët e ekipit	Punonjës	Takime të rregullta	Rishikim arritjesh dhe ndarje përgjegjësish


10.Impact

Afat-shkurtër:

- 50+ studentë do të testojnë sistemin dhe marrin feedback të menjëhershëm për njohuritë e tyre.
- Rritja e angazhimit të studentëve përmes një forme interaktive testimi.
- Kursimi i kohës për pedagogët, pasi sistemi korrigjon automatikisht kuizet.
- Mundësia për të identifikuar menjëherë temat ku studentët kanë vështirësi.

Afat-gjatë:

- Standardizimi i mënyrës së vlerësimit digjital në fakultet.
- Ndhimesë për studentët në përgatitje për provime përmes kuizeve të simuluar.
- Rritja e transparencës në vlerësim dhe reduktimi i subjektivitetit nga ana e pedagogut.
- Mbledhje automatike e të dhënave për performancën akademike në kohë reale.

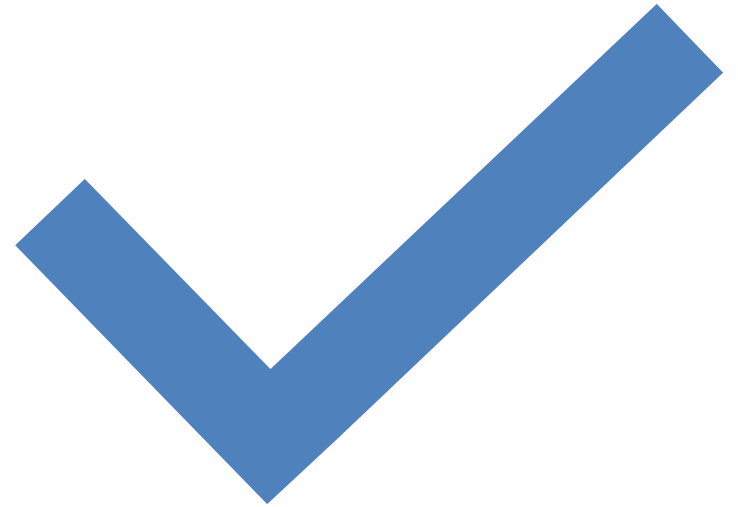



Faleminderit!
